

# 踏切内の状況

令和5年7月末

令和5年9月末



工事着手前 (R4.4月)



踏切内の拡幅工事が進んでいます

- ①レール部周辺の舗装版が設置されました  
木製 ⇒ ゴム製 (KG式踏切舗装版)
- ②踏切内のコンクリート舗装が進んでいます
- ③踏切内はロードヒーティングとなっています

踏切遮断機が設置されるため  
箱抜きをしています




## 踏切内の状況

コンクリート舗装内にロードヒーティングが設置されています



融雪設備の操作盤が設置されました

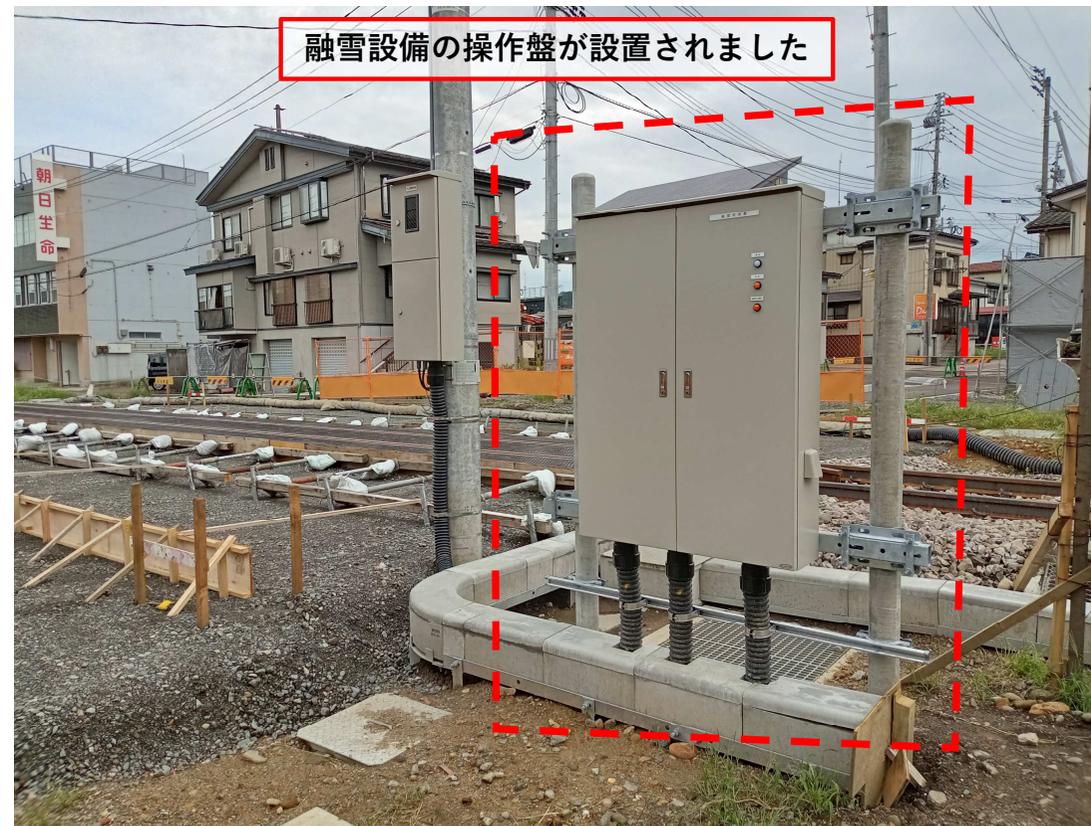

【コンクリート舗装内に設置するメッシュ材】  
コンクリート舗装のひび割れ防止となります



コンクリート舗装の型枠状況

