


## 段階確認一覧表

種別	細別	確認時期	確認項目	確認の頻度
準備工	法線（中心線）、測点	管布設工事前	1. 布設位置の確認 2. 測点の確認 3. 仕切弁、空気弁等の位置	当初及び変更時
	配管材料	材料使用前	1. 数量、品質 2. 製造年度 3. 日水協の刻印 4. 保管方法	当初及び変更時
配管工	布設位置	管布設後	1. 基準箇所（任意）からの離れ 2. 土被り	1回以上/1工事
	不断水穿孔工確認	作業中	1. 漏水確認 2. 水圧テスト 3. 切片確認 4. 排水状況	1回/1箇所
	水圧試験	水張り後	水圧試験	1回/1箇所
	仕切弁開度	本設切替時	1. 新設仕切弁の全開確認 2. 排泥弁、廃止管仕切弁の全開確認	1回/1箇所

段階確認標準フロー（参考）参照

### 段階確認標準フロー図

段階確認項目 …

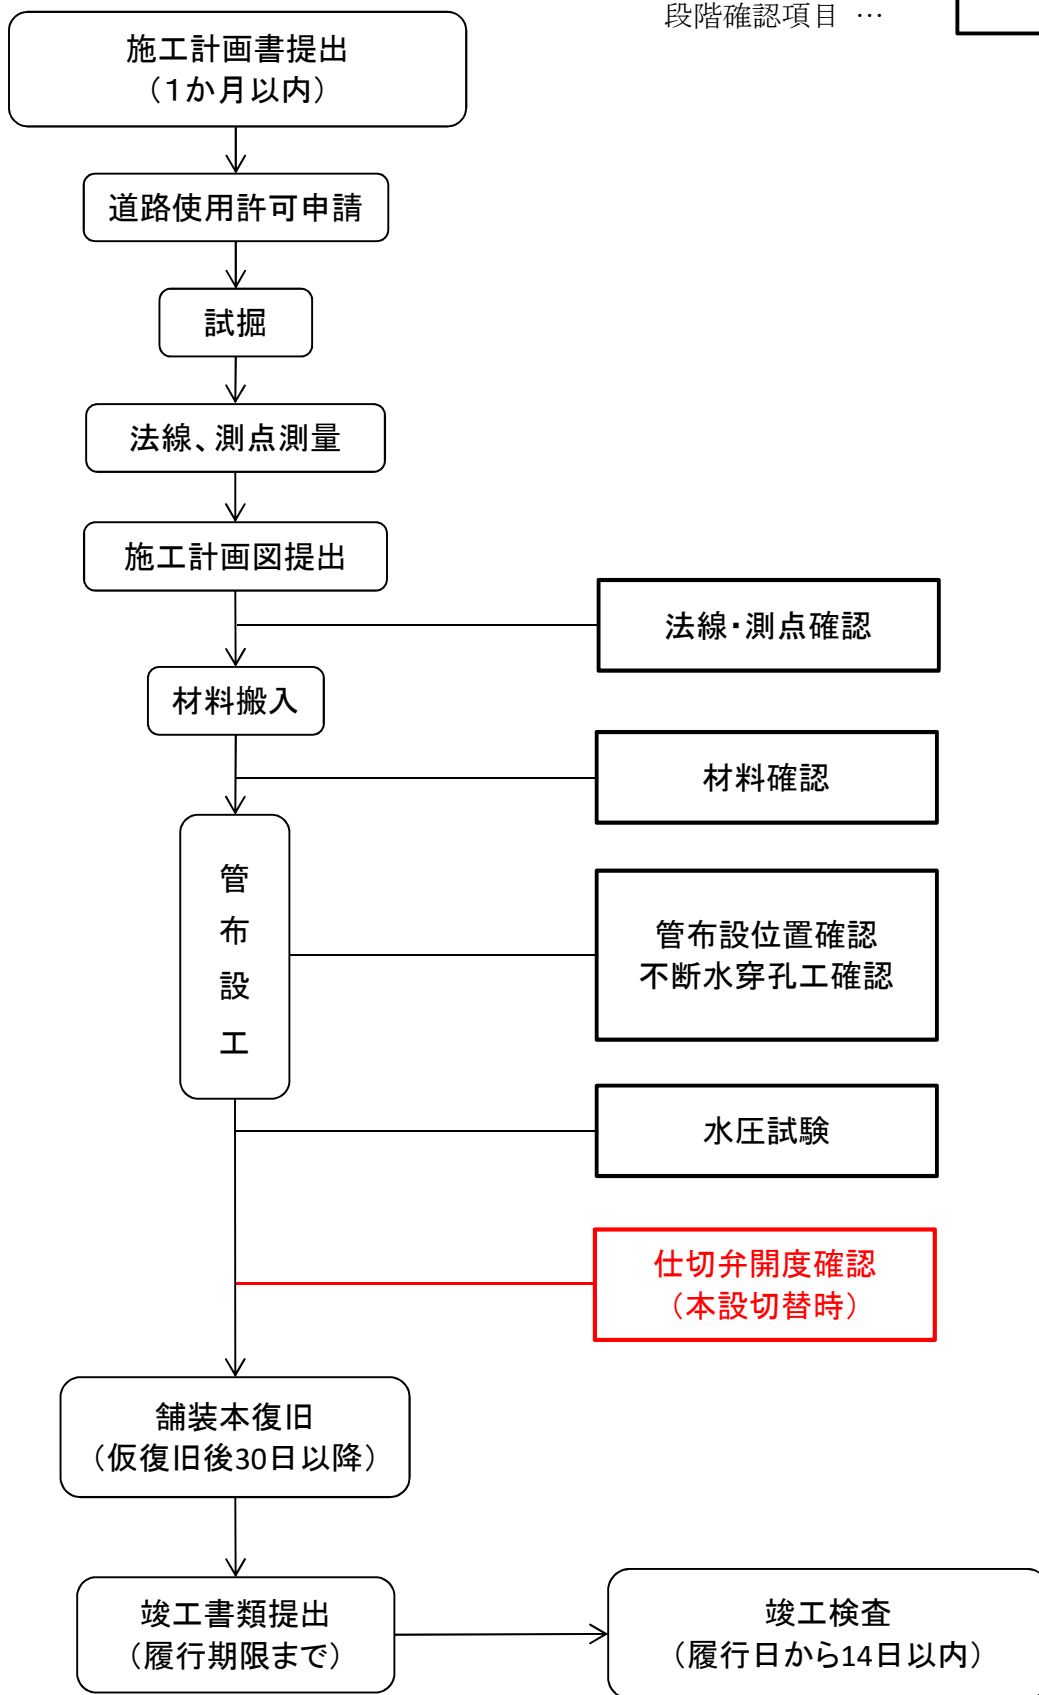

※このフロー図は、標準例を示したものであり、現場条件によって適宜判断すること。
